


地震により住宅を失った方々に、一時的な居住の安定を図るため、応急的な住宅を整備。

- 厚真町、安平町、むかわ町の3町に1期工事130戸、2期工事78戸。
- 福祉仮設住宅を厚真町厚真地区、安平町追分地区の2カ所に整備することとし、12月末の完成を目指す。
- 本道の厳しい気候条件を踏まえ、断熱性能やFF式ストーブの設置などの寒さ対策を実施。

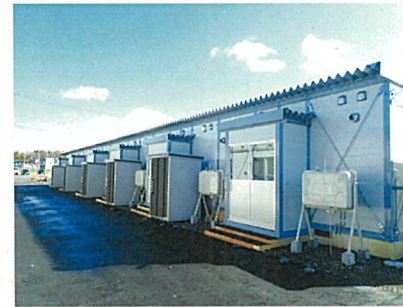

○整備概要

<建設型応急仮設住宅(プレハブ)について>

町名	建設戸数	建設地	建設戸数(戸)		工事の進捗状況
			1期	2期	
厚真町	153	厚真地区	75	54	1期目: 10月31日 完成 2期目: 11月28日 完成予定
		表町公園	36	-	
		厚真高校	18	-	
		本郷小公園	21	-	
		本郷通り	-	42	
		京町公園	-	8	
		新町	-	4	
		上厚真地区	10	14	
		上厚真	10	10	
		鹿沼	-	4	
		合計	85	68	
安平町	30	早来地区	12	5	1期目: 10月31日 完成 2期目: 11月21日 完成
		早来	12	5	
		追分地区	8	5	
		追分	8	5	
		合計	20	10	
むかわ町	25	むかわ地区	25	-	1期目: 10月31日 完成
		大原	25	-	
	208		130	78	

<福祉仮設住宅について>

	建設地区	入居者数	工事の進捗状況
厚真町	厚真地区	108名	10月25日着手 年内の完成を目指す
安平町	追分地区	36名	

<寒さ対策>

